

Slutrapport "Energiprojekt Sanna 2"

Bakgrund

Brf Sanna 2 sökte och fick beviljat bidrag från energifonden för rubricerat projekt. Projektet har genomförts och denna rapport är en slutsammanställning över projektet.

Genomförda delar

I projektet gjordes omputsning och tilläggsisolering av fasader samt installation av frånluftsåtervinning.


Energiutfall

Fjärrvärme

Normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning för brf Sanna 2 redovisas nedan.

Under perioden september 2023 till och med mars 2024 har 193 000 kWh sparats, normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning. Framledes beräknas än större besparing göras, då fasadåtgärderna inte var färdigställda förrän i slutet av november.

Fjärrvärme (kWh), normalårskorrigerat

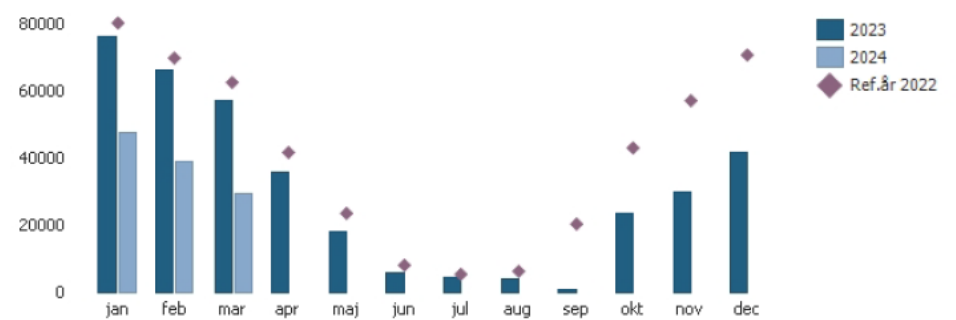

Fjärrvärme (kWh), normalårskorrigerat

Period	2023	2024	diff 2024/	diff/12 mån	Ref.år 2022
jan	76 408	47 542	-41 %	-31 %	80 590
feb	66 517	38 954	-44 %	-36 %	69 802
mar	57 379	29 674	-53 %	-41 %	62 758
apr	36 083				41 937
maj	18 030				23 556
jun	5 839				8 110
jul	4 502				5 500
aug	4 239				6 140
sep	778				20 386
okt	23 579				43 291
nov	29 785				57 462
dec	41 857				70 779
Total	364 996	116 169			490 312

Utvärdering

Energibesparingen från projektet ligger i linje med de beräkningar som gjordes innan projektets genomförande.

Inga klagomål har inkommit under projektet. Projektet har gått enligt plan och inga överraskningar har tillkommit.

Med vänlig hälsning

Erik Stjärnborg, Energieffekt AB, för Brf Sanna 2 i Kristinehamn.
